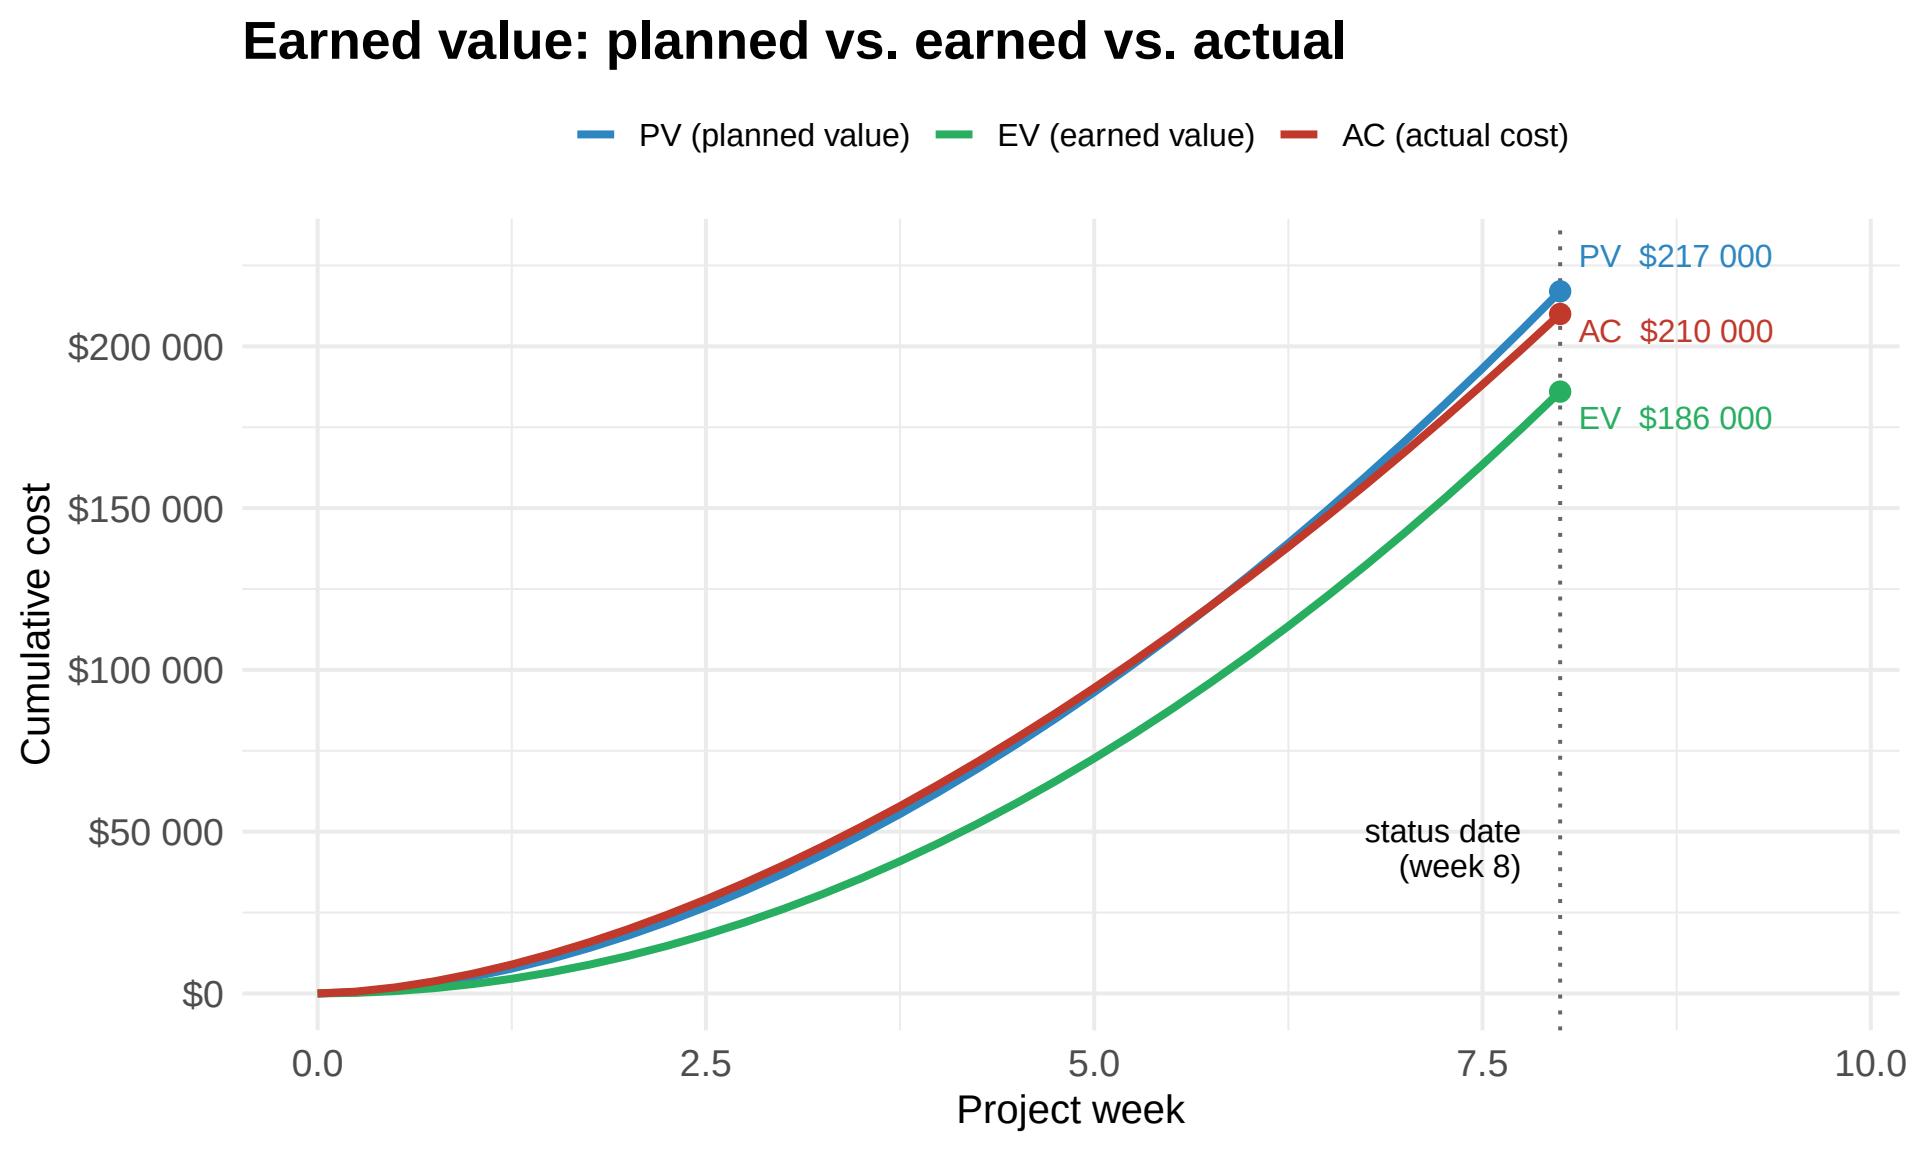
Earned value: planned vs. earned vs. actual
PV (planned value)
EV (earned value)
AC (actual cost)
PV $217 000
AC $210 000
EV $186 000
status date
(week 8)
$200 000
$150 000
$100 000
$50 000
$0
Cumulative cost
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Project week
